

Die Einstufung als «dringend» und gleichzeitig «trivial» lässt den Eindruck entstehen, dass der analysierte Aufwand - mit der aktiven Involvierung von mindestens drei unabhängigen Projektparteien - sowie der erwartete Nutzen möglicherweise nicht vertieft analysiert wurden.

Ein **Aufwand von rund 200 Stunden** wäre für die Erweiterung von Jira ADZ-466 eher knapp bemessen und liesse keinen Spielraum für Eskalationen. Konkret würde dies sämtliche übrigen **Projektaktivitäten für mindestens sechs Wochen** zum Erliegen bringen.

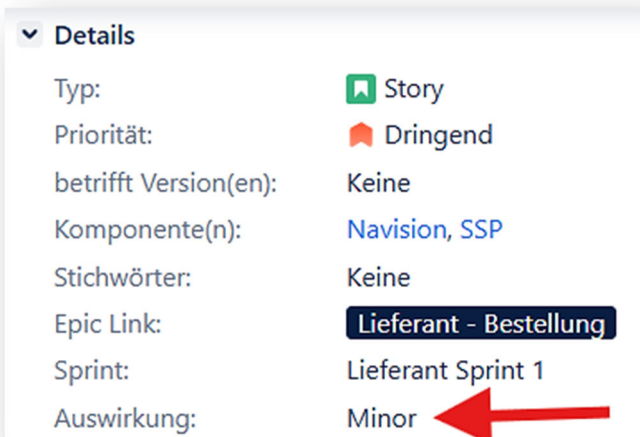


Abbildung 2: Jira Ticket ADZ-466

Weiteres Vorgehen

1. Zeitnaher Update-Eintrag auf Jira-Ticket ADZ-466 mit einer Zusammenfassung dieser Analyse. Ggf. dieses Dokument zum Ticket hochladen.
2. Abklärung mit dem KTAG: Woher stammt die Erwartung, dass es sich hierbei um ein verbindliches Lieferobjekt handelt?
3. Falls sich bei Punkt 2 bestätigt, dass es ausserhalb des Submissionsumfangs bewegt: Abklärung, ob sich der Kosten / Nutzenaufwand für den KTAG lohnen würde, dann Offerte für Change Request (Voraussichtliche Kosten ca. 40 K im Dienstleistungsauftrag)

- Link zu Jira: <https://jira.ag.ch/browse/ADZ-466>
- Abklärungen: <https://chatgpt.com/share/68d9aef7-6988-800d-ba72-864c68b1a35b>
